


Senjen

IMO/off nr	45910
Call Signal	JTMN
Flag	NOR
Ship type	Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, general cargo/passenger.
Year Built	1897/12
Shipyard	Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.
Sno	79
Cargo Handling	Kapasitet 344 personer i innaskjærs fart. 2 luker. 1 bom. 1 kran
Tonnage	338 tdw, 273 brt, 154 nrt.
Size	Loa: 136,0f-Lbp: 127,8f-B: 21,0f-D: 15,2f-Dypg.: 9f 4½f.
Propulsion	1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,3"–18,5"–30,0", slag/stroke: 20,0". 54 NHK. Bygget av Trondhjems mek. Værksted A/S, Trondhjem.
Boiler	1 dampkjele (boiler) med dim.: 9,7f x 10,1f og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Trondhjems mek. Værksted A/S, Trondhjem.
Vessel:	TRS101189701
Manager	A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.
Owner	A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.
Port	Tromsø
Year (y)	1897

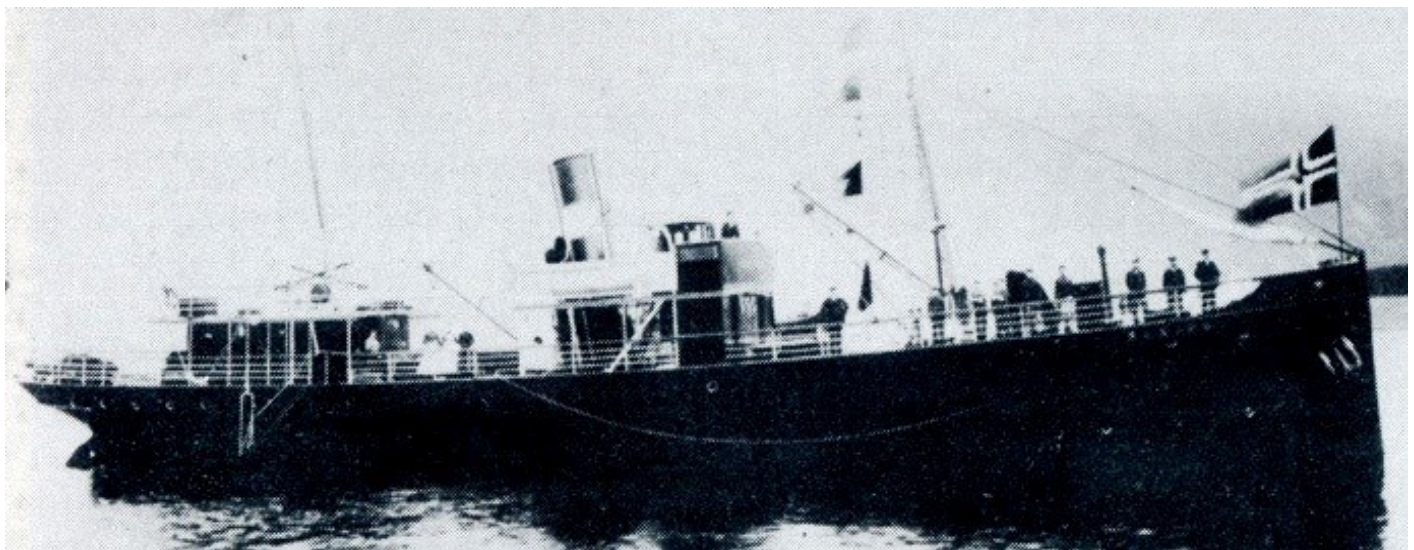

TRS10118970120001 SENJEN. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

History in Norwegian

1897 Bygget som SENJEN av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Levert i desember. Byggekostnader NOK 121.000. 1898 Berørte grunnen i februar ved innseilingen til Sommarøy. Akselbrudd og skadet propell. 1899 Mistet propellen. 1906 Grunnstøtte 06/03 i storm og tett snøvær og ble vrak ved Fiskenes på Andøya i rute fra Harstad med post og passasjerer.

History

1897 Built as SENJEN at Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Delivered in December. Building costs NOK 121.000. 1898 Touched bottom in February at the entrance to Sommarøy. Broke propeller shaft and damaged propeller. 1899 Lost propeller. 1906 Stranded 06/03 in a snowstorm and wrecked at Fiskenes on Andøya en route from Harstad with mail and passengers.
